

**POKYN**

**Úprava obslužné komunikace u APN S**

Označení: <b>Provozní pokyn PP24-01</b>	Vydána dne: <b>31. 01. 2024</b>
Závaznost: <b>Útvary Provozu letiště</b>	Účinnost od: <b>12. 02. 2024</b> Účinnost do: <b>28. 05. 2024</b>
Zpracoval: <b>Ing. Marek Nevlud</b>	Schválil, osoba odpovědná: <b>Ing. Michal Holubec</b>

Z důvodu výstavby nového průmyslového areálu PST IV v bezprostřední blízkosti letiště u hrany jižní odbavovací plochy (APN S) a z důvodů změny ve vlastnictví pozemků dochází k přemístění obslužné komunikace vedoucí z jižní odbavovací plochy na komunikaci perimetru letiště.

**Harmonogram**

**Etapa I**

12.2. - 16.2. 2024

Vybudování oplocení pro vymezení stavby komunikace. Bezpečnostní dozor ÚBL.

**Etapa II**

19.2. - 25.2. 2024 – Realizace obslužné komunikace. Objezd po TWY E

26.2. - 27.2. 2024 - přesun mobilního oplocení na pozici etapy II

15.5. - 16.5. 2024 - přesun mobilního oplocení na pozici etapy II

Demontáž mobilního oplocení, objezd po novém by-passu komunikace

*Pozn: Podrobný harmonogram prací v příloze*

### **Provozní omezení**

Dočesná uzávěra obslužné komunikace v jižní části u APN JIH. Objezd po TWY E a kolem trafostanice TSIII. Nutné povolení stanoviště TWR.

V případě potřeby dle aktuální provozní situace krátkodobé uzavření TWY E na nezbytně nutnou dobu nebo koordinace činnosti s TWR.

### **Vymezení odpovědnosti:**

Koordinátor akce a provedení prací - stavební firma MARPRO STAV (732 392 354)


Bezpečnostní dozor - ÚBL

Kontroly dodržování pravidel – VPL ve směně.

### **Kontakty:**

Koordinátor akce:	732 392 354
VPL ve směně:	725 559 005 nebo kl.122
OBL vedoucí:	728 768 718
OEŽP/elektro	721 857 110
Bezpečnostní dispečink:	597 471 151
Velitel směny HZS	597 471 154

## Přílohy – místo prací, bypass komunikace

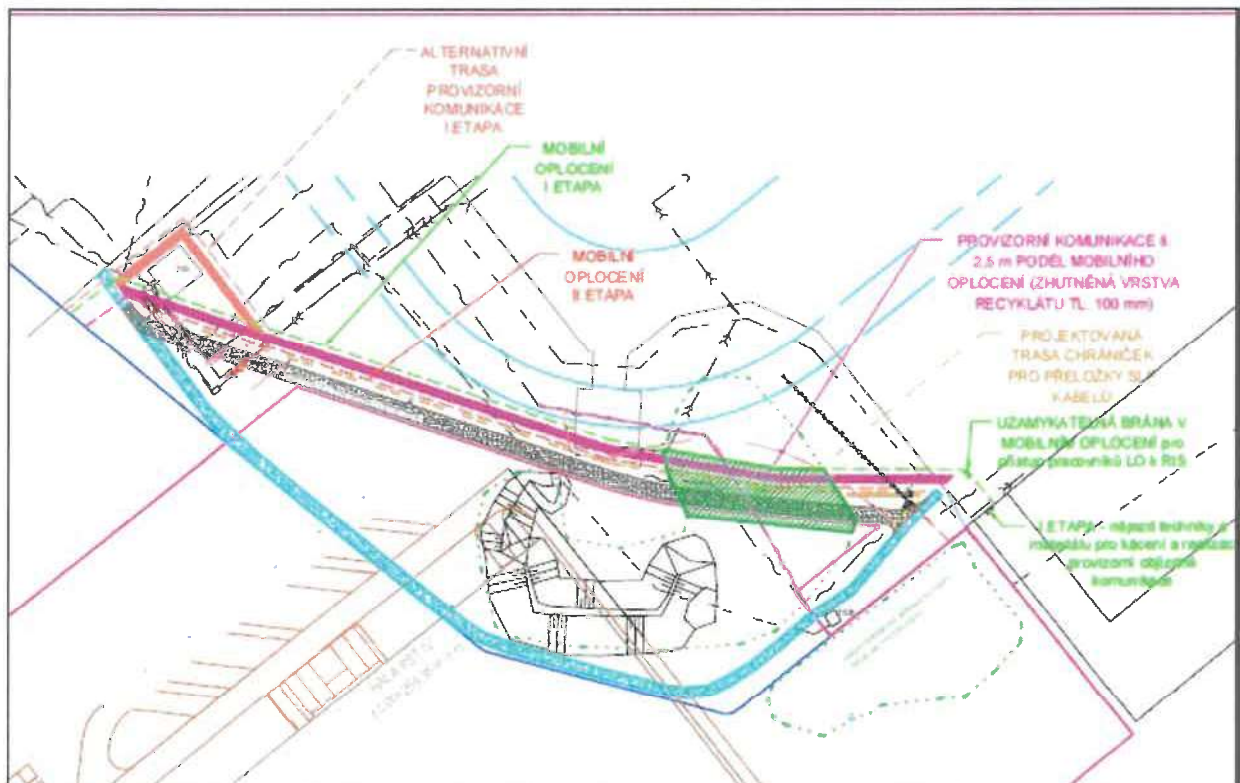

## 29.1.2024 - PST IV x LETIŠTĚ OSTRAVA - HMG PRACÍ VE STÁVAJÍCÍM AREÁLU LETIŠTĚ OSTRAVA

Úloha	Jah.	dok.	2023							2024						
			13.	14.	15.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
datum			KT	KT	KT	KT	KT	KT	KT	KT	KT	KT	KT	KT	KT	KT
vývězení veškerých inženýrských sítí IO v dotčeném území																
ověření hloubkového uložení vytyčených sítí pomocí ručně kopaných sond		03.04.2023														
odpojení + vyklizení trafostanice TS 28, příprava pro demolicí	IO															
montáž mobilního oplocení v pozici I.ETAPY	MARPROSTAV	12.02.2024														
<b>přítomnost Airport security PO DOBU MONTÁŽE MOBILNÍHO OPLOCENÍ</b>																
vykácení části porostu v trase projektovaných přeložek a provizorní komunikace	MARPROSTAV	15.02.2024														
realizace provizorní štěrkové komunikace podél mobilního oplocení	MARPROSTAV	19.02.2024														
<i>možnost návozu techniky, oplocení, materiálů pro realizaci provizorní komunikace přes bránu "PPL"</i>																
přesun mobilního oplocení na pozici II.ETAPY	MARPROSTAV	26.02.2024														
<b>přítomnost Airport security PO DOBU PŘESUNU MOBILNÍHO OPLOCENÍ</b>																
<i>zpřístupnění provizorní štěrkové komunikace pro IO SECURITY</i>																
uložení chrániček pro provedení přeložek SLP (KABEL Č.1)	MARPROSTAV	28.02.2024														
<b>provedení přeložek SLP</b>	IO	18.03.2024														
kácení zbývajících částí lesního porostu v areálu PST	MARPROSTAV	26.02.2024														
realizace nové projektované obslužné komunikace k TS 3	MARPROSTAV	01.04.2024														
realizace nového oplocení letiště	MARPROSTAV	22.04.2024														
dosyp krajnice mezi oplocením a komunikací	MARPROSTAV	06.05.2024														
realizace zemního valu (v rozsahu projektované části betonového oplocení)	MARPROSTAV															
přesun mobilního oplocení na pozici I.ETAPY	MARPROSTAV	15.05.2024														
<b>přítomnost Airport security PO DOBU PŘESUNU MOBILNÍHO OPLOCENÍ</b>																
odstranění provizorní štěrkové komunikace, panelové komunikace, terénní úpravy, ozelenění	MARPROSTAV	17.05.2024														
demontáž a odvoz mobilního oplocení + finální uzavření nového oplocení letiště	MARPROSTAV	24.05.2024														
<b>přítomnost Airport security PO DOBU DEMONTÁŽE MOBILNÍHO OPLOCENÍ</b>																

DLE HARMONOGRAMU VÝSTAVBY PST IV
